

鳴見台小学校 保護者様

## 鳴見台小学校仮設校舎建設について（お知らせ）

紅葉の季節、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃から、鳴見台小学校の学校運営につきまして、ご支援とご協力を賜り心から感謝申し上げます。

さて、鳴見台小学校につきましては、平成28年度には13学級300名ほどであった児童数が、令和5年5月1日現在では23学級541名となっており、児童の入る教室数に余裕がなくなっている状況です。将来の推計におきましても、今後5年間で5学級程度の増加が見込まれており、今後の児童数増加に対応するために、新たに教室を確保する必要があります。

こういった状況から、子供たちの学習環境を保持していくために、今年度中に運動場に仮設校舎を建設することとしております。

建設工事期間中、皆様にはご不便をお掛けしますが、安全に工事が竣工するよう、可能な限りの対策を講じて施工してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしく願いいたします。

### 【事業内容】

令和6年度からの教室不足に備え、令和5年度中に運動場の一角に仮設校舎を整備する。

仮設校舎使用期間：令和6年3月～令和12年3月

※ 令和5年12月中旬より本格的に建設工事を行う予定です。

### 【仮設校舎の内容】

構 造：軽量鉄骨造2階建て

延床面積：約740㎡

整備諸室：普通教室6室、男女トイレ

### 【問い合わせ先】

長崎市教育委員会 学校施設課

担当：溝口（みぞぐち）


電話：829-1192（直通）

## 1 仮設校舎建設スケジュール（予定）

	R5 8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R6 4月	R12 3月
設計										仮設校舎供用開始
基礎工事										
本体工事										
設備工事										
内装工事										
外構工事										
引っ越し										
車両・音など										

- ※1 大型車両は最大で10t車を想定しております。通行時は交通誘導員を配置いたします。
- ※2 1日あたり工事車両が5～6台通行予定です。
- ※3 騒音対策として防音シートを設置予定です。

## 2 車両通行経路

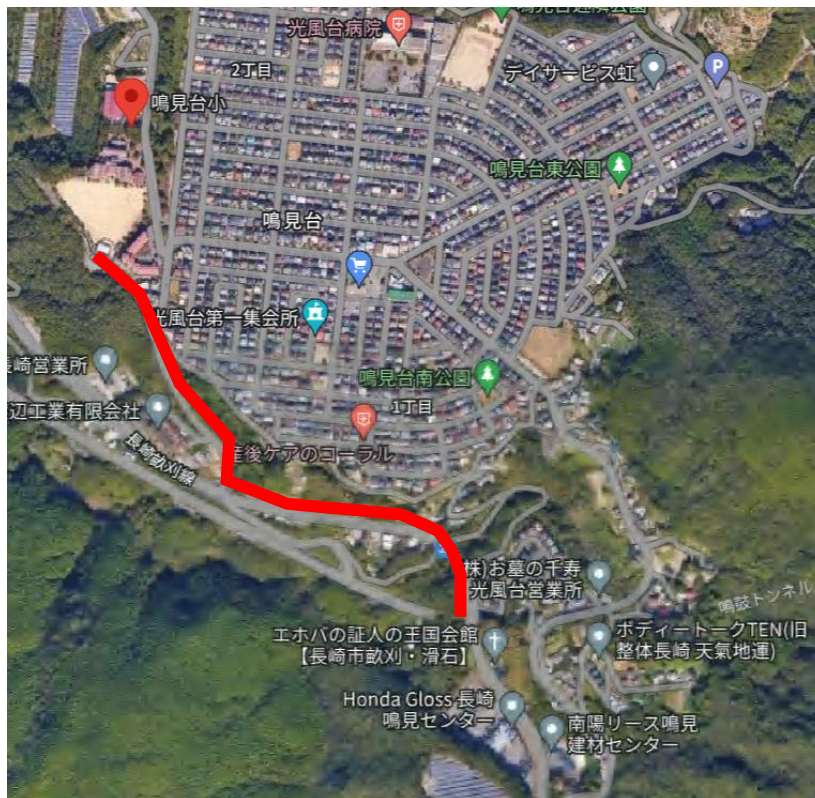

### 3 配置図等


#### 配置図



※工事車両が通行時には交通誘導員を配置します。

#### 平面図

1F



2F

